

威海市生态环境工作 简 报

(重点工作专刊 2024 年第 2 期)



威海市生态环境委员会办公室

2024 年 7 月 10 日

2024 年二季度威海市主要污染物总量 减排重点项目进展情况通报



一、基本情况

为确保重点减排工程按期完成建设、切实发挥减排效益，各区市对辖区内的减排项目进行了再次挖潜、确认，并对我市 2024 年度的重点减排项目进行了调整。截至目前，全市共计划实施各类总量减排项目 21 个，其中，水减排项目 7 个，大气减排项目 14 个。截止第二季度，已建成项目 8 个，占 38.1%；在建项目 12 个，占 57.1%；未动工项目 1 个，占 4.8%。

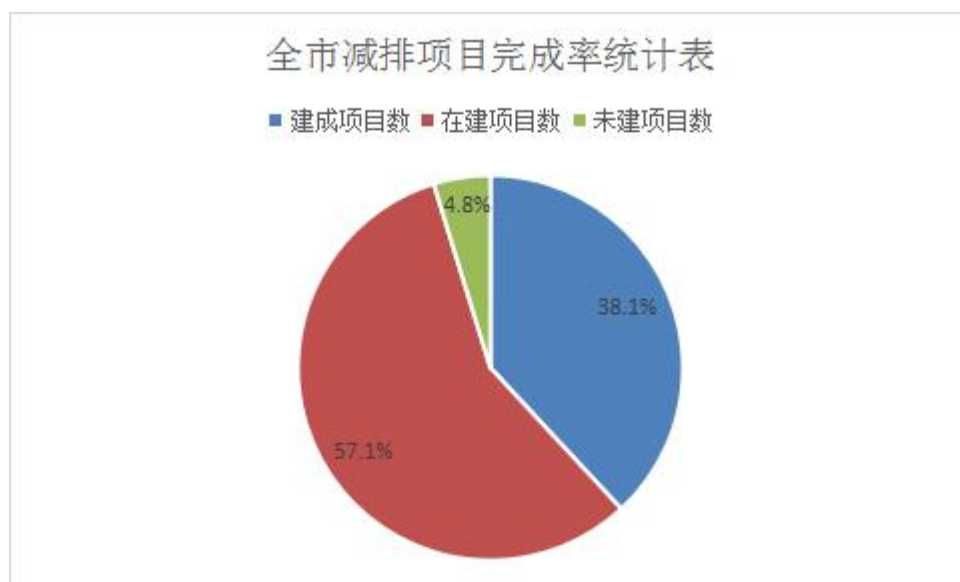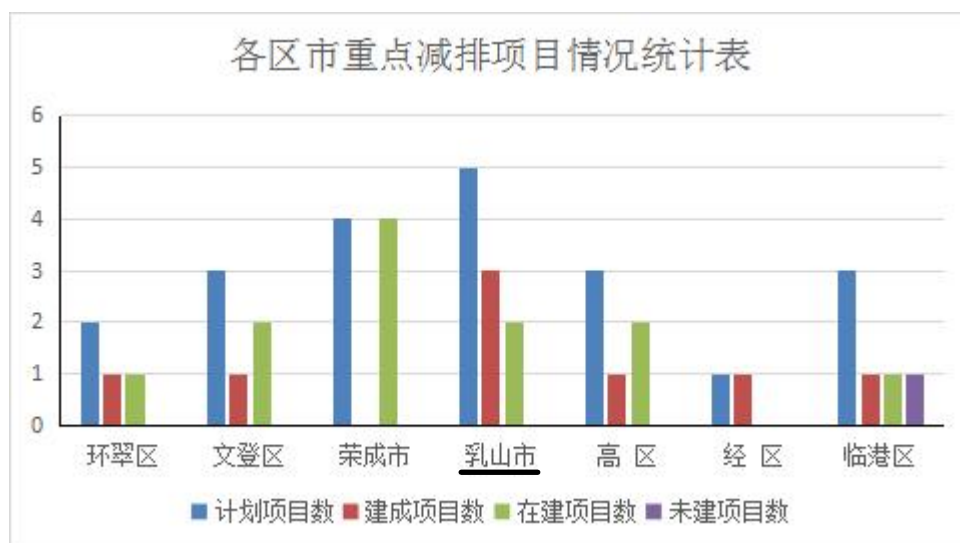


（一）大气减排项目情况

2024 年计划实施各类大气减排项目共 14 个,截止第二季度,已建成项目 8 个,占 57.1%; 在建项目 5 个,占 35.7%; 未动工项目 1 个,占 11.7%。

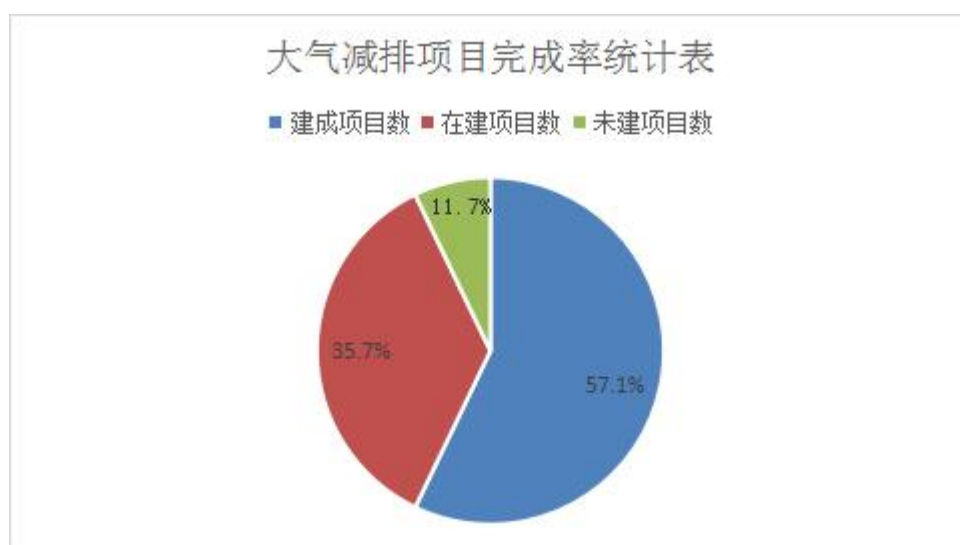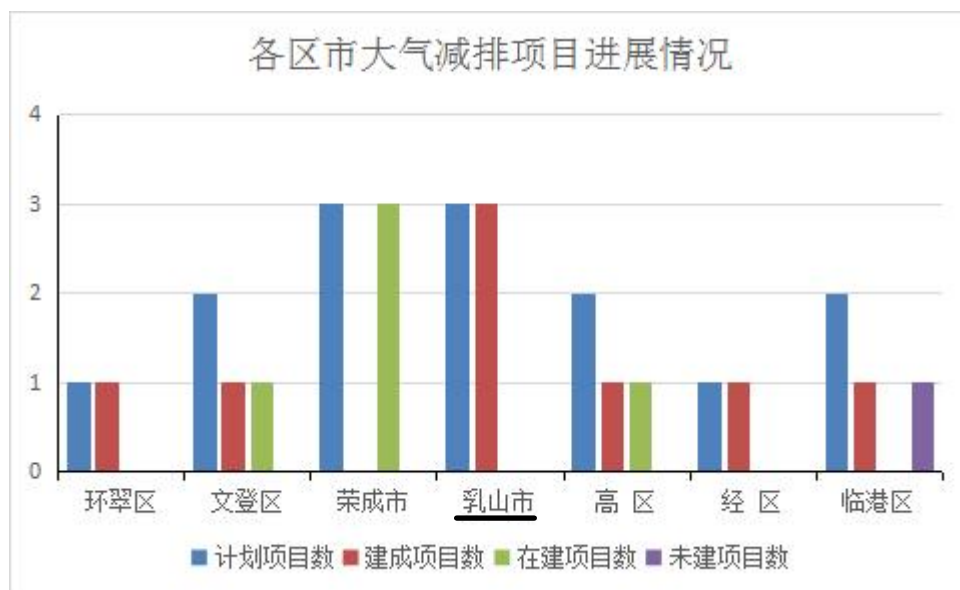

(二) 水减排项目情况

2024 年计划实施各类水减排项目共 7 个，截止第二季度，已建成项目 0 个，在建项目 7 个，占 100%，未动工项目 0 个。

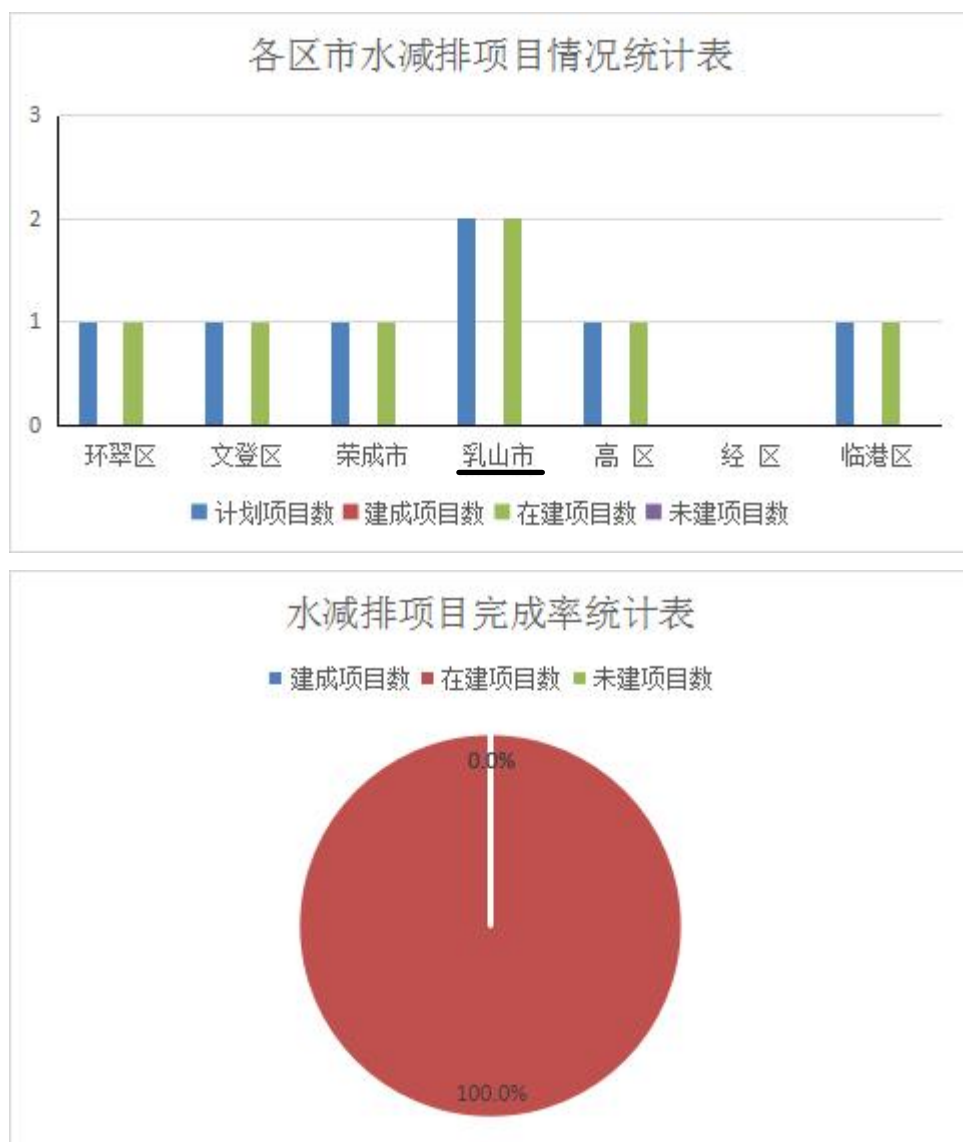

从目前进度情况看，不同区域内重点项目进展程度存在较大差异，部分项目施工建设进展缓慢。其中，临港区因二季度新纳入 1 个减排工程，暂处于未动工状态。

二、相关要求

重点减排项目按期完成，是确保 2024 年减排任务完成的前提。为全面完成我市 2024 年减排目标任务，各区市要及时跟进

项目进展，并做好以下工作：一是要做好统筹规划。对尚未开工的项目及时跟进进度、尽快开工，确保按计划完工；对在建项目要加快建设进度，确保如期完工、投入运行。二是要加强运行管理。对已建成项目，要加强组织验收、强化监管，确保环保治理设施正常运行，切实发挥减排效益。三是要做好减排测算。根据核算指南，提前做好重点减排项目减排档案资料收集及查漏补缺，强化已竣工项目的污染物减排量测算，按季度做好已竣工减排项目的上报及年度减排任务的预估评判，确保完成减排任务目标。

- 附件： 1. 2024 年第二季度主要污染物总量减排重点项目
建设进度汇总表
2. 2024 年第二季度主要污染物总量减排重点项目
建设进度明细表

附件 1

2024 年第二季度主要污染物总量减排重点项目建设进度汇总表

行政区	大气减排项目				水减排项目				合计			
	计划数	建成项目数	在建项目数	未建项目数	计划数	建成项目数	在建项目数	未建项目数	计划数	建成项目数	在建项目数	未建项目数
环翠区	1	1	0	0	1	0	1	0	2	1	1	0
文登区	2	1	1	0	1	0	1	0	3	1	2	0
荣成市	3	0	3	0	1	0	1	0	4	0	4	0
<u>乳山市</u>	3	3	0	0	2	0	2	0	5	3	2	0
高 区	2	1	1	0	1	0	1	0	3	1	2	0
经 区	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
临港区	2	1	0	1	1	0	1	0	3	1	1	1
合 计	14	8	5	1	7	0	7	0	21	8	12	1

附件 2

2024 年第二季度主要污染物总量减排重点项目建设进度明细表

序号	行政区划	单位名称	项目内容	建设进度			计划投资	已完成投资
				开工时间 (年-月)	实施进 度 (%)	具体进展情况	万元	万元
1	环翠区	桥头镇人民政府	采用集中拉运模式，对桥头镇 9 个村进行农村生活污水治理。	2024-05	42	铺设支管及主 管道，修建污水 收集池。	1623	580
2	环翠区	威海吉斯通机电设备有限公司	工业废气 VOCs 治污设施升级改造，由 UV 光氧升级为活性炭吸附脱附催化燃烧。	2023-06	100	已完成	5	5

3	文登区	威海威力风机有限公司	原辅料全部改用低挥发性有机化合物含量涂料	2024-04	30	已完成部分原辅料替代	100	30
4	文登区	威海众鑫玻璃有限公司	废气处理设施由低温等离子废气处理设施提升为活性炭吸脱附+催化燃烧处理设施	2024-03	100	已完成	20	20
5	文登区	文登区水利局	40 个行政村农村污水治理项目	2024-04	30	已开工建设，其中 3 个行政村建设完工。	1500	500
6	荣成市	三星重工业(荣成)有限公司	涂装车间活性炭吸附+催化燃烧变更为韩国的 CHF+CO 工艺，设备容量增加，更换为韩国高技术活性炭，处理效率增加。	2024-01	65	设备安装	400	260

7	荣成市	荣成市供热有限公司	荣成市核能供热配套管网及设施建设项目，实现荣成市区核能供热，分期替代现有面积的小型燃煤热电联产机组供暖，近期（供热面积450万平米）可节省标煤8万吨/年。	2023-01	60	管道施工	73800	44280
8	荣成市	荣成市住房和城乡建设局	在荣成市第一污水处理厂西侧建设中间提升泵站、脱氮曝气生物滤池、活性炭吸附滤池各1座，使污水处理厂出水水质由一级A提高到地表水准IV类。	2023-02	95	已完成安装调试	1000	950

	9	荣成市	黄海造船有限公司	喷漆房 VOCs 废气治理设施升级改造项目，将总厂及新厂现有两套喷漆房有机废气处理设施进行升级改造，由干式滤棉+活性炭吸附设备升级为干式滤棉+活性炭吸附+RCO 催化燃烧有机废气处理设备。	2024-04	50	设备安装	350	175
▲	10	乳山市	乳山市水务集团有限公司	对 30 个村庄进行农村生活污水治理。	/	5	进行污水处理池选址，制定设计方案等	3000	100
▲	11	乳山市	徐家镇人民政府	新修 1800 余米排污管道，采用压力管道与重力管道结合的方式，将华隆生物科技、华隆食品等公司生产、生活污水连接市政污水管网。	/	10	前期管道勘察完成，污水管道设计完成，正在进行设计审批。	180	50

▲	12	乳山市	乳山热电有限公司	关停 75t/h 循环流化床锅炉和 6MW 抽凝式汽轮机。	2023-12	100	已完成	/	/
▲	13	乳山市	玫德集团威海有限公司	V 法铸造设备设施提标改造项目	2023-08	100	已完成	1500	800
▲	14	乳山市	威海市永盛铸业有限公司、乳山市润泽机械配件厂等 6 家铸造有限公司	关停威海市永盛铸业有限公司、乳山市润泽机械配件厂等 6 家铸造有限公司	2023-12	100	已完成	/	/
	15	高区	威海克莱特菲尔风机股份有限公司	VOCs 废气治理设施提升改造项目	2024-04	20	设备招标文件评审及设备供应商考核	600	100

16	高区	威海水务投资有限责任公司	威海市初村污水处理厂三期扩建工程，扩建后日处理量增加 2 万吨	2023-06	90	土建已整体完成，设备安装已完成 98%。	10036	7000
17	高区	威海中复西港船艇有限公司	破产倒闭		100		/	/
18	经区	威海威洋石油有限公司	1 号泊位加装船岸对接系统，并改造“冷凝+活性炭吸附+新型轻烃吸附+解析”综合性油气回收装置处理挥发的油气，进一步提高有机废气 VOCs 收集及处理效果。	2023-12	100	已完成	980	743.8

19	临港 区	威鹏晟（山东） 机械有限公司	喷漆废气治理设备提升改造，将原有光 氧设备改为“过滤+活性炭吸附脱附催化 燃烧”设备。	2024-01	100	已完工	50	50
20	临港 区	草庙子镇人民 政府	铺设污水管网，对农村生活污水进行收 集利用。	2024-01	30	已开工建设，正 在按照序时进 度推进此项工 作	90	25
21	临港 区	山东浩然特塑 股份有限公司	#1 厂房聚砜树脂工程有机废气处理设施 提升改造项目	2024-07	0	前期准备	221.15	0

发送：各区市人民政府，国家级开发区管委

抄送：市生态环境局各分局
